

# PROGRAMA ONU-REDD



Organización de las Naciones  
Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura



Al servicio  
de las personas  
y las naciones



## **Apoyo a la acción nacional de REDD+ Marco del programa global 2011-2015 (AAN)**

**Anexo de la  
actualización semestral  
sobre los progresos de 2015  
del Programa ONU-REDD**

---

**Decimoquinta reunión de la  
Junta Normativa del Programa  
ONU-REDD**

---

**7-10 de noviembre de 2015  
San José, Costa Rica**

De acuerdo con la decisión de la Junta Normativa, no se imprimirán copias en papel de este documento para reducir al mínimo el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. Los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD están disponibles en Internet en [www.unredd.net](http://www.unredd.net) o [www.un-redd.org](http://www.un-redd.org).

## Índice

<b>1.</b>	<b>Estado del Programa AAN</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Introducción</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>REDD+ basado en la comunidad</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>Evaluación de las necesidades del país</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>Apoyo específico al país</b>	<b>6</b>
<b>5.1</b>	<b><i>Apoyo específico</i></b>	<b>6</b>
<b>5.2</b>	<b><i>Apoyo técnico</i></b>	<b>24</b>
<b>6.</b>	<b>Información financiera</b>	<b>25</b>

## Lista de tablas y figuras

Tabla 1.	CNA: resumen del presupuesto aprobado, área de enfoque y estado de las evaluaciones en los países y las regiones.	5
Tabla 2.	Presupuesto y gasto del AAN de noviembre de 2011 a junio de 2015 a los niveles de productos y resultados y un desglose por organizaciones de la ONU participantes.	25
Figura 1.	Importe aprobado para países y regiones en apoyo específico, del 1 de enero al 30 de junio de 2015	7
Figura 2.	Proporción de gasto de respaldo del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y cantidad de países apoyados.	24

## 1. Apoyo a la Acción nacional de REDD+: Programa global 2011-2015 (AAN): estado del Programa

**Título del programa:** "Apoyo a la Acción nacional de REDD+: Marco del Programa Global 2011-2015"

<b>Fecha de la aprobación por parte de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD:</b>	9 de agosto de 2011
<b>Fecha de la primera transferencia de fondos:</b>	01 de noviembre de 2011
<b>Fecha final de acuerdo con el documento del Programa:</b>	31 de diciembre de 2015

### Socios de implementación:

- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

<b>Organizaciones participantes de la ONU</b>	<b>Presupuesto aprobado asignación 1 nov. 2011 – 31 dic. 2015 (US\$)</b>	<b>Gastos acumulativos + Compromisos 1 nov. 2011 – 30 jun. 2015 (US\$)</b>
<b>FAO</b>	42.931.964	38.117.654
<b>PNUD</b>	44.270.801	37.395.517
<b>PNUMA</b>	33.833.903	31.478.009
<b>Costos indirectos de apoyo (7%)</b>	8.472.567	7.249.027 <sup>1</sup>
<b>Total</b>	<b>129.509.235</b>	<b>114.240.207</b>

<sup>1</sup> Los cálculos de los costos indirectos de apoyo en la actualidad son inferiores al 7%; esta cifra se ajustará en los informes de fin de año.

## 2. Introducción

El Programa ONU-REDD cuenta con dos modalidades de entrega: los Programas Nacionales y el "Apoyo a la Acción Nacional de REDD: +Marco del Programa Global 2011-2015" (AAN). Los resultados y el progreso bajo el AAN durante el período de seis meses de enero a junio de 2015, se integran y resumen en la *Actualización semestral sobre los progresos de 2015 del Programa ONU-REDD*, de la que este Anexo es un suplemento.

En este Anexo se presentan el estado y los resultados emergentes de las iniciativas de REDD+ basado en la comunidad y las evaluaciones de las necesidades de los países, así como los logros alcanzados durante el período de seis meses en cada país y región con apoyo específico. También se proporciona una instantánea del apoyo específico para el país ofrecido a través del apoyo técnico.

Al final de este Anexo, encontrarán la información financiera a nivel de los resultados y productos de AAN, y el desglose por organizaciones de la ONU participantes, FAO, PNUD y PNUMA para el período del 1 de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2015.

## 3. REDD+ basado en la comunidad

Bajo el resultado del compromiso de partes interesadas del AAN, el producto '*Partes interesadas a nivel comunitario se comprometen con la implementación del estado de preparación, y contribuyen a esta implementación, a través del apoyo a REDD+ basado en la comunidad (CBR+)*' fue aprobado, como un nuevo producto (4.6), en la décima Reunión de la Junta Normativa por un importe total de US\$ 4 millones para el trabajo en seis países (Camboya, República Democrática del Congo, Nigeria, Panamá, Paraguay y Sri Lanka). CBR+ es una asociación entre el Programa ONU-REDD y el Programa de pequeñas donaciones (SGP) y el Fondo verde (GEF) para otorgar asignaciones directamente a los pueblos y las comunidades indígenas para facultarlos para participar plenamente en el diseño, la implementación y el monitoreo de actividades vinculadas al estado de preparación para REDD+, y desarrollar experiencias, lecciones y recomendaciones a nivel local que pueden llegar a los procesos nacionales de REDD+. Las asignaciones se distribuyen a través del probado y comprobado mecanismo descentralizado de entrega de asignaciones de SGP. La contribución del Programa ONU-REDD a la fase piloto de CBR+ (2014-2017) incluye US\$ 400.000 por país para asignaciones directas a proyectos de nivel comunitario en cada uno de los seis países piloto (los fondos restantes respaldan el fomento de la capacidad para los donatarios, el desarrollo participatorio de los planes de CBR+ de países, la gestión de conocimientos, el monitoreo y la evaluación y la gestión del programa). Esta contribución será equiparada por un cofinanciamiento similar de SGP, que se aportará a través de apoyo en especie y a través de asignaciones paralelas de SGP que complementan los objetivos de CBR+.

Los Comités Directores Nacionales de SGP de los seis países piloto se han complementado con expertos en REDD+ para formar Comités Directores Nacionales de CBR+ que brindan asesoramiento general a CBR+ a nivel del país, incluso la revisión y aprobación de propuestas de proyectos de CBR+. Hay asignaciones de hasta US\$ 50.000 disponibles para una amplia gama de actividades de nivel comunitario, como abordar agentes impulsores de deforestación y degradación de bosques, fomentar las capacidades de las comunidades para participar en el proceso de preparación para REDD+, aclarar y mejorar la definición de derechos de uso de tierras, explorar los mecanismos para acciones de REDD+ y mejorar la implementación de salvaguardas para REDD+, entre otras.

A mediados de 2015, el CBR+ está en estado plenamente operativo con los planes de países aprobados en todos los seis países piloto. Estos planes ya están guiando el diseño y la selección de la

primera serie de proyectos de CBR+. Se han ofrecido talleres integrales de fomento de la capacidad destinados a partes interesadas básicas para la concientización en materia de REDD+ y la iniciativa de CBR+, y para fomentar su capacidad de redacción de propuestas, así como también el diseño y la gestión de proyectos. La iniciativa de CBR+ ya está alcanzando beneficios tangibles en cuanto al fomento de la capacidad a nivel comunitario y el aprendizaje, y ayudar a entender a las partes interesadas los enfoques de REDD+ y plasmarlos en proyectos y actividades.

Hasta ahora, se han recibido más de 150 propuestas de proyectos de CBR+ en cinco de los seis países piloto, y esta cifra aumentará ya que se siguen aceptando presentaciones en algunos países. Este volumen supera las expectativas iniciales, e indica la alta demanda del tipo de apoyo que las asignaciones de CBR+ ofrecen a las comunidades, así como también el valor de esta iniciativa, de da más fuerza al interés de las partes interesadas de nivel básico en los esfuerzos nacionales de CBR+. En los últimos meses, los Comités Directores Nacionales de CBR+ (NSC) han recibido propuestas y se ha brindado amplio apoyo a candidatos para consolidar el diseño de los proyectos y los impactos.

En Camboya, República Democrática del Congo (DRC), Panamá y Sri Lanka, las primeras series de asignaciones de CBR+ han sido desembolsadas (en la mayoría de los países piloto, las asignaciones se desembolsan en fases para promover una gestión adaptativa de esta nueva iniciativa)). En Nigeria, el Comité Directivo Nacional de CBR+ está en las etapas finales del proceso de selección y aprobación de proyectos; se espera seleccionar los donatarios en noviembre de 2015. En Paraguay, ha comenzado una serie de sesiones de capacitación y talleres de partes interesadas como preparación del lanzamiento de un llamado a propuestas.

Durante el año que viene, el Programa ONU-REDD trabajará con los seis países piloto para acceder a tipologías de proyectos y necesidades de fomento de la capacidad para garantizar que las lecciones informen y mejoren las series posteriores, además de consolidar la iniciativa en general.

#### **4. Evaluación de las necesidades del país**

La iniciativa de las evaluaciones de necesidades de los países (CNAs), respaldada por el Programa ONU-REDD y coordinada por la secretaría, se presentó como iniciativa nueva (producto 8.7) en el plan de trabajo y presupuesto de AAN para 2014. Fue aprobada en la undécima reunión de la Junta Normativa. El presupuesto total es de US\$ 1,2 millones. Las evaluaciones intentan proporcionar a los líderes de los distintos países actividades de preparación y programas más integrados y mejor coordinados. Después de un [llamado a propuestas](#) ([español](#) y [francés](#)) realizado en 2014, se aprobaron propuestas de los países y las regiones siguientes: Guatemala, Madagascar, Malawi, Perú, Sudán Meridional, Túnez y Zimbabwe; y Mesoamérica (México, Honduras, Colombia, El Salvador y República Dominicana) y África Occidental (Benin, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Togo). El alcance de las propuestas varió significativamente; en efecto, ciertas evaluaciones se caracterizan por su amplio alcance, ya que evalúan el estado de preparación para REDD+, las brechas y necesidades para el desarrollo de una estrategia nacional de REDD+; otras, en cambio, se concentran en ciertas áreas como la tenencia de tierras y los derechos de carbono, el sistema nacional de monitoreo de bosques (NFMS), medidas, reportes y verificación (MRV) y nivel de referencia de emisiones (REL), participación de las partes interesadas, compromiso de las instituciones y creación de sinergias entre actores. Varios países también han recibido apoyo específico del Programa ONU-REDD, que se ha tomado en cuenta durante la implementación de las evaluaciones para evitar superposiciones y fomentar las sinergias.

Según lo previsto, las evaluaciones desarrolladas específicamente permiten al proceso identificar necesidades más específicas y considerar los contextos locales ricos. Las evaluaciones iniciales se

caracterizan por una notable especificidad que hubiera sido posible obtener mediante metodologías estandarizadas más amplias. Todas las evaluaciones se implementan a través de los organismos de ONU-REDD, con un organismo en constante diálogo con el país en cuestión para garantizar que sean los países quienes lideran la evaluación.

Si bien estas evaluaciones se adaptan a la situación del país específico o la región específica, con ciertas variantes, la mayoría de los países han seguido estructuras y secuencias metodológicas similares, según se observa a continuación.

1. Desarrollar una metodología
2. Examinar la información existente
3. Recopilar datos adicionales (habitualmente a través de entrevistas y talleres)
4. Evaluación de las necesidades iniciales
5. Validación de los resultados (habitualmente a través de talleres)
6. Informe final con plan de acción/mapa de ruta

Para junio de 2015, todos los planes de trabajo estaban listos y se encuentran en distintas etapas de implementación según el país (Tabla 1). Madagascar ha completado la evaluación, con un solo intercambio pendiente.

**Tabla 1.** CNA: resumen del presupuesto aprobado, área de enfoque y estado de las evaluaciones en los países y las regiones.

<b>País/región</b>	<b>Importe aprobado (US\$):</b>	<b>Área de enfoque de CNA</b>	<b>Actualización de estado</b>
<b>Guatemala</b>	40.000	Amplio estado de preparación para REDD+, incluso necesidades institucionales y financieras.	Metodología específica desarrollada y acordada. Evaluaciones iniciales de cada pilar previsto antes de noviembre de 2015
<b>Madagascar</b>	122.000	Tenencia de tierras, NFMS, Visión/diálogo intersectorial.	Todos los informes están listos y han sido validados. Intercambio pendiente con la República del Congo. (para septiembre de 2015)
<b>Malawi</b>	64.675	Marcos de trabajo de políticas y legal, capacidad de fomento de la estrategia y mapa de rutas.	Fase de preparación. Se han contratado consultores y se está realizando el trabajo de preparación para el taller inicial.
<b>Perú</b>	96.000	Coordinación del apoyo, las necesidades vinculadas con pagos basados en pagos (RBP) y el secuenciamiento de actividades.	Fase de preparación. Términos de referencia para el consultor acordados con el coordinador. Arreglos finalizados entre organismos. FAO gestionará los fondos.
<b>Sudán Meridional</b>	80.001	Amplias oportunidades de REDD+, apoyo necesario por fuente, priorizar y secuenciar las actividades, evaluar oportunidades de conexión a redes de conocimientos.	Fase de preparación, consultores internacionales identificados, documentos relevantes examinados y aprobados por el gobierno, incluso el presupuesto ajustado.
<b>Túnez</b>	117.400	Arreglos institucionales, NFSM.	Fase de preparación. Consultor internacional para ICA contratado nuevamente; taller inicial realizado

			10-11 junio.
<b>Zimbabwe</b>	105.000	NFMS con mapeo más amplio de partes interesadas.	Fase de preparación. Se revisaron y acordaron el alcance y el presupuesto y se realizaron revisiones ulteriores.
<b>Mesoamérica</b>	385.000	NFMS con focalización en las oportunidades de cooperación Sur-Sur.	Se realizaron talleres de evaluación y validación. El informe y el plan de cooperación en vías de revisión del país.
<b>África Occidental</b>	264.366	NFMS con focalización en las oportunidades de cooperación Sur-Sur.	Fase de preparación. Taller inicial previsto para agosto. Intercambios metodológicos organizados entre líderes de organismos y consultores de CNA de Mesoamérica.

## 5. Apoyo específico al país


El apoyo específico del país proporcionado a través de AAN incluye apoyo específico y respaldo. Los países siguen los [procedimientos](#) aclarados en la octava reunión de la Junta Normativa celebrada en 2012 para solicitar apoyo específico. El pedido se envía a través del Coordinador Nacional de REDD+ a la Secretaría del Programa ONU-REDD que, en colaboración con las organizaciones de la ONU participantes, evalúa el pedido. El apoyo de respaldo, en cambio, se solicita por enlace directo con las organizaciones de la ONU participantes. Las secciones que siguen ofrecen actualizaciones de los dos tipos de soporte al 30 de junio de 2015.

### 5.1 Apoyo específico

Desde la adopción del mecanismo impulsado por la demanda en 2012, el importe total puesto a disposición de los países y la cantidad de pedidos de apoyo específico provenientes de países ha crecido constantemente; el importe máximo se alcanzó en 2014. En la primera mitad de 2015, se aprobaron diez pedidos de apoyo específico de ocho países (Bután, Camboya, Chad, Ecuador, Etiopía, Nepal, Panamá, Túnez) y dos regiones.<sup>2</sup> a través de 1) un pedido de Fiji para Fiji, Papúa Nueva Guinea (PNG), Islas Salomón y Vanuatu; y 2) un pedido de Ghana para Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. El importe total aprobado fue de US\$ 970.000. La Figura 1 muestra el importe aprobado para cada país y región.

<sup>2</sup> Los pedidos regionales se refieren a pedidos que incluyen varios países vecinos.

**Figura 1.** Importe aprobado para países y regiones en apoyo específico del 1 de enero al 30 de junio de 2015.

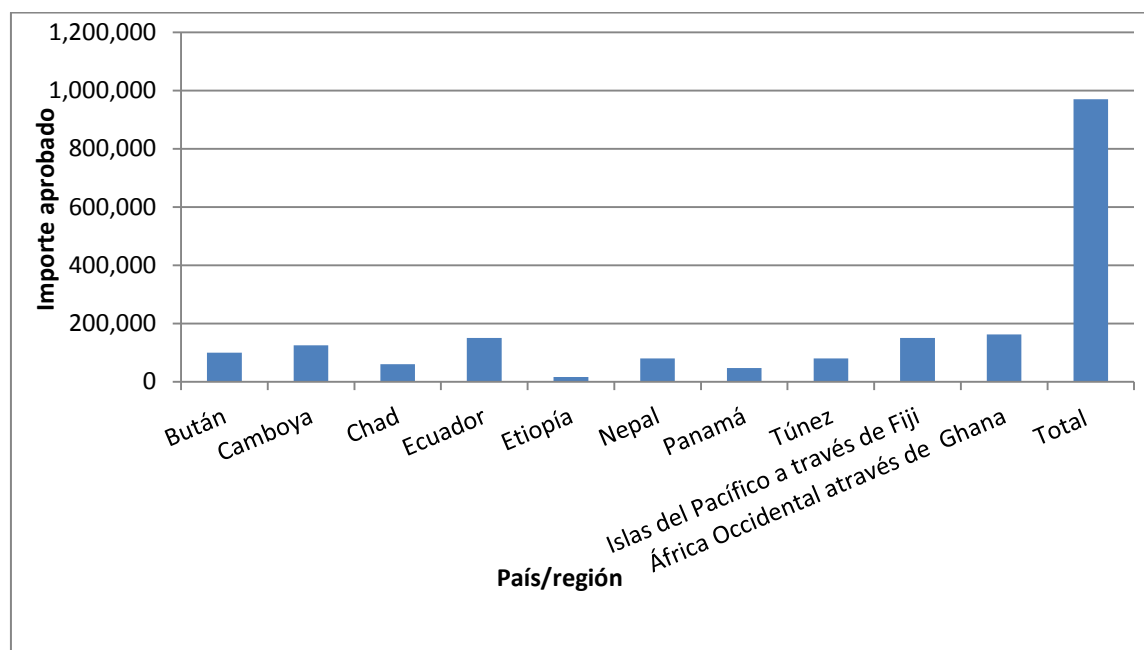

Se solicitó y aprobó apoyo para las áreas siguientes:

- Desarrollo y preparación de la presentación de FREL/FLR a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), incluso la facilitación de los intercambios de información entre países en etapas distintas del proceso. (Pedidos de Camboya, Ghana, Nepal y Fiji, con intercambio con países vecinos);
- Cuestiones de tierras forestales y de pastoreo y repercusiones relacionadas para REDD+ (pedido de Túnez);
- Finalización de NFMS y fomento de la capacidad en materia de gestión de datos (pedido de Panamá);
- enfoque nacional de las salvaguardas, diseño completo del sistema de información de salvaguardas (SIS) y una comprensión mejorada de los riesgos y los beneficios (pedido de Chad);
- Consolidación, según corresponda, los marcos institucionales, políticos, legales y operativos para la implementación de estrategias de REDD+, con apoyo a una estrategia financiera y medidas para hacer frente a los agentes impulsores de la deforestación (pedido de Ecuador); y
- Estudio socioeconómico de la contribución de bosques (pedido de Etiopía).

El apoyo al fomento regional de la capacidad y el intercambio sur-sur sobre el desarrollo y la redacción del nivel de referencia de emisiones para el sector forestal/niveles de referencia forestal (FREL/FRL) se ejemplifica por el apoyo aprobado del pedido conjunto de Fiji, PNG, Islas Salomón y Vanuatu. De forma similar, el apoyo a las necesidades regionales de capacidad técnica en materia de inventarios nacionales de carbono forestal fue aprobado tras lo pedido realizado por la coalición de catorce países de África Occidental.

Desde 2012 al 30 de junio de 2015, se han respaldado a través de este mecanismo los esfuerzos de REDD+ de 41 países y tres regiones, con un total de más de US\$ 15,3 millones aprobados. La entrega financiera (desembolso de importes aprobados) para todas las actividades de apoyo específico



completada alcanzó el 92% al 30 de junio de 2015. En la actualidad, la implementación del apoyo específico está en curso en 29 países y 3 regiones. Teniendo en cuenta que AAN está tocando a su fin, la implementación bajo AAN del apoyo específico terminará progresivamente en 2015<sup>3</sup>; solo unos pocos períodos de implementación ya aprobados se extenderán a 2016/2017.

Una nota de guía que circuló entre sesiones (a la que se puede acceder [aquí](#)), aclaró los procedimientos y el enfoque para desarrollar propuestas de apoyo específico conjuntas con organizaciones de la sociedad civil (CSO) y/o pueblos indígenas. Aunque no hay propuestas conjuntas recibidas al 30 de junio de 2015, varios países con apoyo específico en curso están recibiendo apoyo vinculado a los componentes elaborados del compromiso de las partes interesadas a nivel nacional y sub-nacional, por ejemplo, Bután, Camboya, Costa Rica, Ecuador, Etiopía, Honduras, Kenya, México, Myanmar y Perú.

La siguiente sección presenta resultados clave seleccionados y el progreso realizado durante el período cubierto por países y regiones con apoyo específico.

Explicación de abreviaturas utilizadas en la sección que sigue:	
TS1, TS2...	Los números definen el apoyo dirigido específico en una secuencia de apoyo específico aprobada para el país. TS1= primer pedido aprobado, TS2, TS3... apoyo adicional aprobado ("suplemento").
R1, R2...	Se refiere al resultado previsto de acuerdo con el pedido aprobado, el documento del proyecto, el marco de los resultados, o similarmente a los que se hace referencia como progreso reportado al 30 de junio de 2015.
X%	Porcentaje que se refiere a la entrega financiera (desembolso del importe aprobado al 30 de junio de 2015).
NP	NP indica que el país tiene un Programa Nacional financiado por el Programa ONU-REDD
MRV& M, GOB, SE, SF&MB, GE&PS	Estas son las áreas de trabajo (Resultados de AAN) a las que se refiere el apoyo específico: Medidas, Reportes y Verificación y Monitoreo (MRV& M); Gobernanza (GOB); Participación de Partes Interesadas (SE); Salvaguardas y Beneficios Múltiples (SG&MB); Economía Verde y Compromiso del Sector Privado (GE&PS).

<sup>3</sup> Los pedidos de apoyo específico referentes a SNA solamente se aprobarán hasta el 30 de septiembre de 2015.

## PEDIDOS DE PAÍS

### ARGENTINA (NP)

*Apoyo para consolidar las capacidades nacionales en materia de monitoreo de bosques e incorporación de salvaguardas ambientales y sociales para el Programa REDD+.*

*(MRV&M, SF&MB, GE&PS)*

**Pedido por un importe total de US\$ 191.512 aprobado en noviembre de 2012.**

Los enfoques de apoyo a las Evaluaciones Ambientales y Sociales Estratégicas (SESA) cerraron 2012 con un 74% de entrega. El componente en curso de MRV&M presenta una entrega del 90%.

**Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- **R1.1:** Conocimiento mejorado de metodologías de monitoreo de la degradación a través de la organización de un taller y la cooperación Sur-Sur. 40 participantes (40% mujeres) del gobierno argentino y del sector académico.
- **R1.2:** Las capacidades técnicas para mantener y completar la plataforma de difusión web del NFMS aumentaron a través del soporte remoto de tecnología de la información, expertos en monitoreo y desarrolladores/apoyo de TI en la 'Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable' (SayDS). Despliegue del servidor para la plataforma y desarrollo y optimización de servicios especializados.
- **R1.3:** Evaluación de la plataforma en relación con el lanzamiento de la versión beta.

### BANGLADESH (NP)

*Apoyo para implementar el mapa de ruta del estado de preparación para REDD+ al abordar los riesgos de corrupción y fomentar la capacidad en materia de impactos sociales; desarrollar el plan de acción de MRV y el estado de preparación nacional para REDD+, apoyar el fomento de la capacidad en materia de procesamiento de datos geoespaciales y gestión de bases de datos; y fomentar la capacidad en materia de Gas Invernadero (GHG), inventario de uso de tierras, cambio en el uso de tierras y sector forestal (LULUCF). (MRV&M, GOB, SF&MB)*

**Pedidos por un importe total de US\$ 357.500 aprobados en 2012-2014.**

TS1, TS2 y TS3 aprobados en 2012 (US\$ 262.500);

TS4 aprobado en julio de 2014 (US\$ 95.000).

TS1-TS3: 93%, TS4: 10% de entrega.

### Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:

- **TS1, R1:** El estudio de integridad de REDD+ cambió de enfoque a la luz del Programa Nacional, hacia un análisis de los arreglos de gestión del Fondo Verde en Bangladesh, tendiente a extraer las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en materia de transparencia, representación, supervisión, conflictos de intereses, quejas y reparaciones, alineamiento a través de instituciones sectoriales y monitoreo y evaluación del rendimiento.
- **TS4, R1,2:** Recolección de datos para el inventario de GHG ha comenzado y ha mejorado la capacidad para GHG con la sesión de capacitación completada en junio con la participación de 25 funcionarios técnicos (32% mujeres).

### BENIN

*Apoyo para mejorar la comprensión de la situación de tenencia de tierras en el país a fin de guiar el desarrollo de la estrategia nacional de REDD+. (GOB)*

**Pedido por un importe de US\$ 79.500 aprobado en diciembre de 2014. 0% de entrega.**

**Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- Fase de preparación (La carta de acuerdo con el gobierno (*Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles*) se firmó en julio de 2015 y se prevé una rápida implementación.

### BUTÁN

*Apoyo para el desarrollo del estado de preparación para REDD+ en Bután; Monitoreo y MRV para REDD+; para el desarrollo y fomento de la capacidad para el plan de desarrollo de NFMS; para respaldar el fomento de la capacidad necesaria para generar información sobre NFMS y MRV y consolidar los resultados alcanzados bajo el apoyo específico anterior; para el desarrollo de la estrategia nacional de REDD+ con miras a garantizar las salvaguardas, incluso los sistemas de distribución de beneficios y las medidas anti-corrupción, para mejorar la capacidad en materia de salvaguardas ambientales y sociales y para obtener el compromiso de las partes interesadas; análisis de los riesgos ambientales y beneficios de REDD+, análisis de PLR. (MRV&M, GOB, SE, SF&MB)*

**Pedidos por un importe total de US\$ 448.250 aprobados en 2012 y 2014.**

TS1 aprobado en jul 2012 (US\$ 103.250), TS2 aprobado en feb 2014 (US\$ 245.000) y TS3 aprobado en abril 2015 (US\$ 100.000)

TS1: 100%, TS2: 104%, TS3: 0% de entrega.

**Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- **TS2, R2:** Apoyo ofrecido por el Grupo de Trabajo Técnico de REDD+ para preparar la versión preliminar de las pautas para el compromiso de partes interesadas y el material de comunicación.
- **TS2, R5: Plan de acción de NFMS** validado en una reunión de partes interesadas celebrada en enero (30 participantes, 43% mujeres).
- **TS3, R1:** Se mejoró la capacidad para analizar el primer inventario nacional de bosques de Bután con una misión de apoyo técnico que se sirvió de la herramienta Open Foris Collect. La transferencia de datos del inventario forestal nacional (NFI) a la base de datos Open Foris Collect está en curso.
- **TS3, R2:** Se mejoró la capacidad para FRL con un taller de fomento de la capacidad realizado en junio (25 participantes, 40% mujeres). En el mismo taller del mes de julio se redactó el plan de acción de FRL.

sobre la versión preliminar de la estrategia. Se la ha compartido con miembros del Grupo de Consulta de REDD+ y del Equipo Técnico durante los talleres de concientización realizados por el Grupo de Género. En junio de 2015, también fomentaron la concientización vinculada al tema de "Género y REDD+" en un programa de diálogo radial llamado, "Centro de medios de mujeres de Camboya (WMC)".

- **TS3:** El Intercambio de conocimientos Sur-Sur y el fomento de la capacidad en materia de FREL/FRL fueron los objetivos del taller sub-regional que contó con la presencia de expertos técnicos de Indonesia, Nepal, Malasia y Viet Nam, y tuvo lugar en Siem Reap, Camboya (27 participantes, 30% mujeres).

**CAMERÚN**

*Apoyo para fomentar la capacidad para la participación de partes interesadas en la gobernanza de bosques (interfaz FLEGT-REDD+). (GOB)*

**Un pedido de US\$ 35.800 aprobado en agosto de 2013.** 100% de entrega.

- No hay actividades en curso, el apoyo específico fue completado e informado.

**CAMBOYA**

*Apoyo complementario para el NP de Camboya para respaldar la consolidación de las redes comunitaria y alcanzar la participación plena y efectiva en los esfuerzos de REDD +; y se incluyeron efectivamente mujeres en la gerencia del proceso para alcanzar el estado de preparación para REDD+, y se realizaron esfuerzos de concientización sobre REDD+ a través de distintos medios de comunicaciones; y apoyo para el fomento de la capacidad de desarrollo de FREL/REL, diálogo e intercambio de información entre Camboya, Indonesia, Malasia, Nepal y Viet Nam sobre el desarrollo de FREL/FRL a medida que comienzan a interactuar con UNFCCC. (MRV&M, se)*

**Pedidos múltiples aprobados en 2013, 2014 y 2015. Importe total aprobado: US\$ 200.000**

TS1 aprobado en nov 2013 (US\$ 10.000), TS2 aprobado en jun 2014, (US\$ 65.000) y TS3 aprobado en abril 2014 (125.000)

TS1-TS3: 26% de entrega.

**Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- **TS2, R2:** Una lista de verificación de género para la estrategia nacional de REDD+ fue desarrollada como herramienta para proporcionar comentarios

**CHAD**

*Apoyo para el desarrollo de un enfoque nacional de las salvaguardas y para alcanzar una mayor comprensión de los riesgos y beneficios vinculados con REDD+. (SF&MB)*

**Un pedido de US\$ 60.000 aprobado en agosto de 2015.**

- Aún no ha comenzado la implementación: se espera la respuesta de la contraparte gubernamental.

**CHILE**

*Apoyo para el diseño e implementación piloto de un fondo forestal ambiental replicable, que permitiría realizar pruebas prácticas de un esquema de distribución de beneficios y pagos basados en resultados dirigidos a pequeños agricultores. El piloto intentará complementar y mejorar las herramientas existentes de desarrollo forestal y, eventualmente, las políticas públicas futuras. (SE y GE&PS)*

**Un pedido de US\$ 560.000 aprobado en noviembre de 2014.** 0% de entrega.

#### Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:

- Proyecto aprobado en abril de 2015.
- **R1-3**, fase de preparación: arreglos conjuntos para la dotación de personal y el plan de trabajo han sido acordados entre la CONAF (*Corporación Nacional Forestal*) y el Programa ONU-REDD. Los términos de referencia incluyen un análisis de los mecanismos nacionales e internacionales que es posible constituir como instrumentos de financiamiento posibles, además de un análisis económico y de costos para la opción de mitigación estratégica para REDD+ en Chile. Los términos de referencia (ToR) integran consideraciones de género, incluso dentro de su proceso de monitoreo e indicadores de rendimiento.

#### COLOMBIA

*Apoyo a la facilitación de la participación de partes interesadas para actualizar la propuesta para alcanzar el estado de preparación para REDD+. (SE)*

#### Un pedido de US\$ 50.000 aprobado en febrero de 2013.

100% de entrega.

- No hay actividades en curso: apoyo específico completado e informado.

#### COSTA RICA

*Apoyo i) al desarrollo y la implementación de un SIS que integre los principios y criterios sociales y ambientales (SEPC) a la estrategia de REDD+, ii) al sistema nacional de monitoreo de bosques, iii) a la participación del sector privado con el sector de impulsores principales (industria de la piña), financiamiento de REDD+ y adaptación de los pagos por servicios a los ecosistemas (PES) como mecanismo para compartir beneficios en el marco de la estrategia de REDD+ y iv) a la gestión de conocimientos, en particular la documentación y sistematización de consultas de indígenas y agricultores para REDD+ en Costa Rica. (MRV&M, GOV, SE, SF&MB, GE&PS)*

#### Pedidos por un importe total de US\$ 1.002.383 aprobados en 2012-2014.

TS1 aprobado en oct 2012 y complementado en julio de 2013 (US\$ 242.383), TS2 aprobado en agosto de 2014 (US\$ 760.000).

TS1: 100%, TS2 30% de entrega.

TS1 completado.

#### Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:

#### TS2:

- **NFMS** - Revisión y actualización del componentes del plan de trabajo de NFMS a través de una misión inter-organismos y comunicación con la contraparte nacional (FONAFIFO).
- Sistematización del compromiso de partes interesadas y la gestión de conocimientos de pueblos indígenas y participación de la sociedad civil, incluso la documentación de los procesos y las lecciones aprendidas.
- Estrategia y participación del sector privado en REDD+.
- **R3**: Agentes impulsores de la deforestación (piña) monitoreados.
- **R4**: Se lanzaron oportunidades de inversión privada para actividades vinculadas a REDD+.
- **R7**: Desarrollo del primer borrador de la estrategia nacional de Costa Rica para REDD+.
- Determinación de costos de políticas, actividades y medidas de REDD+ apoyadas.
- **R 4-5, 8**: El análisis de costos y la identificación de políticas y medidas (PAM) se ha iniciado como parte del proceso para la ERPD / estrategia nacional de REDD+.
- **R4**: Comenzó la determinación del alcance de las oportunidades de inversión para financiar la estrategia nacional de REDD+.
- Adaptación de PES.
- Se lanzó el análisis institucional para la estrategia nacional REDD+ de Costa Rica.

#### CÔTE D'IVOIRE (NP)

*Apoyo para el lanzamiento oficial de la implementación del mecanismo de REDD+ y los arreglos institucionales; desarrollo de R-PP; sistemas de información geográfica (GIS) y detección remota; actividades para lograr el compromiso de las partes interesadas; mapa de ruta para mejorar el marco legal para la implementación de REDD+ y evaluación de la viabilidad de un sistema nacional de pagos por servicios ambientales (PES), y consolidación de la participación del sector privado en REDD+. (MRV&M, GOB, SE, GE&PS)*

#### Pedidos por un importe total de US\$ 525.000 aprobados en 2012-2014.

TS1 aprobado en nov 2012 (US\$ 235.000).

TS2 aprobado en dic 2013 (US\$ 60.000), TS3

aprobado en agosto 2014 (US\$ 230.000).

TS1: 79%, TS2: 99%, TS3: 69% de entrega.

TS2 completado.

#### Resultados clave y progreso de enero a junio 2015

**TS1:**

- **R3:** Se realizó una sesión de capacitación sobre el inventario de GHG que reunió a 25 personas (16% mujeres) en abril de 2015 en Abidjan. El objetivo era brindar capacitación práctica paso a paso sobre la metodología de preparación de un inventario de GHG. Los resultados incluyen la identificación de acciones futuras, incluso 1) capacitación adicional para consolidar las capacidades nacionales para la preparación de inventarios de GHG; 2) la implementación de acuerdos para compartir datos y crear archivos y documentación para el inventario de GHG; 3) apoyo a la preparación de un inventario integral para el sector de LULUC; 4) la mejora de las técnicas de recopilación y compilación de datos, y 5) la contribución a la producción de la tercera comunicación nacional mejorada para Côte d'Ivoire.
- **R3:** Se realizó una sesión de capacitación sobre los sistemas de clasificación de la cobertura de tierras (LCCS) en julio de 2015, con la asistencia de 21 participantes (19% mujeres). Aportó a los participantes técnicas prácticas para el uso de LCCS-V3 para desarrollar un sistema de clasificación del uso de tierras/cobertura de tierras armonizado, que facilitará las transferencias y la explotación de conjuntos de datos del uso de tierras/ la cobertura de tierras y aportará el monitoreo coherente del cambio en el uso de tierras/la cobertura de tierras en Côte d'Ivoire. La capacitación condujo a diversas recomendaciones, entre ellas la creación de una clave de clasificación del uso de tierras/la cobertura de tierras para Côte d'Ivoire; y de un grupo de trabajo técnico (TWG) para armonizar las leyendas de clasificación; la suscripción de un acuerdo entre SST/REDD+ y SNSF/REDD+ para promover el uso de LCCS-v3 como norma para la clasificación del uso de tierras/la cobertura de tierras y la producción de una lista integral de instituciones nacionales vinculadas al mapeo del uso de tierras/la cobertura de tierras y a la concientización sobre la necesidad de contar con leyendas armonizadas de clasificación.

**TS3:**

- **R1-2:** Dos ministerios de tres han adoptado la versión modificada del decreto sobre el establecimiento, la organización y el funcionamiento de la Comisión Nacional de REDD+.
- **R3-4:** Los análisis legales e institucionales han identificado áreas y acciones necesarias para establecer un marco legal para REDD+.

- **R8:** Borrador completado de un estudio de viabilidad sobre un esquema nacional de PES. La validación está prevista para septiembre de 2015.
- **R9:** Se preparó la versión preliminar del plan de acción con una mapa de acción y recomendaciones sobre acciones que es necesario realizar para la implementación de PES.
- **R10:** Las partes interesadas clave fueron movilizadas e informadas sobre PES y REDD+ mediante la creación de un grupo de trabajo sobre PES que se reunió tres veces durante el primer semestre.

**REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (DRC)**

*Apoyo a áreas de reformas legales para la implementación de REDD+ y riesgos de corrupción; dimensiones y equidad de género, NFMS y para validar las conclusiones del informe sobre T21\* y completar la posible integración con la Visión para 2035 del "Libro Blanco"; validar el trabajo analítico sobre los múltiples beneficios de REDD+ y la conclusión sobre la integración con NFMS y SIS; completar y llevar al nivel operativo las normas sociales y ambientales de REDD+ nacional; desarrollar los elementos de sistema nacional de información sobre salvaguardas (SIS); y presentar el enfoque de las salvaguardas de DRC en COP21. (MRV&M, Gob, SE, GE&PS)*

**Pedidos por un importe total de US\$ 1.027.354 aprobados en 2012 y 2015.**

TS1 aprobado en oct 2012 (US\$ 90.000).

TS2 aprobado en jul 2014 (US\$ 512.000), TS3

aprobado en dic 2014 (US\$ 90.000).

TS1: 62%, TS2: 100%, TS3: 100% de entrega.

TS1: completado y comunicado anteriormente.

**Resultados clave y progreso de enero a junio 2015**

**TS2 (completado):**

- **R1, R2 y R3:** Conclusión de la evaluación del cambio de la cobertura de bosques para el período 1990-2010, incluso una presentación de resultados y un evento para medios.
- **R4:** Formalización de la carta de acuerdo con la difusión de inventario de bosques de MDEE, por la cual se completaron ¾ del inventario de bosques preliminar. Hay un informe preliminar con los resultados disponible. El resto del NFI preliminar se completó a través del pedido de TS subsiguiente.
- **R5, R7 y R8:** Se realizó una sesión de capacitación sobre los inventarios de GHG y se actualizó la base de datos para el sector agrícola forestal y otros usuarios de tierras (AFOLU).



- **R7:** Trabajo en los arreglos institucionales para aumentar la accesibilidad a datos entre instituciones cuyo resultado ha sido la revisión de opciones legales para estimular las iniciativas de compartir datos. Se ha desarrollado un acuerdo preliminar para compartir datos tras las consultas realizadas con partes interesadas.

#### TS3:

- **R1:** Se realizó la validación de un “Estudio de viabilidad para la evaluación económica y el mapeo de beneficios múltiples en DRC” y el informe para un análisis de modelación de distintas rutas de desarrollo y de qué forma la estrategia de REDD+ puede apoyarlos, que estuvo a cargo del Millennium Institute y utilizó el modelo Threshold 21 (Estudio T21).
- **R2:** Ambos estudios se validaron en un taller: Un estudio de viabilidad para la evaluación de los beneficios múltiples de REDD+ fue lanzado en francés e inglés. El estudio de escenarios de T21 se lanzará en Internet en diciembre de 2015. Se acordó un mapa de ruta para la integración de los resultados de los estudios al desarrollo de la estrategia gubernamental hasta 2035.
- **R3,4:** Se celebró una reunión de expertos en Kinshasa sobre la revisión de las normas nacionales de REDD+ , seguida de una sesión de capacitación (21 participantes, 14% mujeres) para desarrollar y mejorar los indicadores para las normas. Esto se combinó con una sesión de capacitación a cargo del Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF), que cubrió las evaluaciones del impacto ambiental. La sesión de capacitación conjunta fue una oportunidad para que ONU-REDD y FCPF trabajen en un enfoque armonizado de las distintas salvaguardas de REDD+ y los marcos desarrollados en DRC; también se clarificó de qué forma es posible aplicar las normas nacionales a través de la implementación de REDD+. Después del taller, los participantes fueron asignados a proyectos de campo para recopilar datos sobre su aplicación de las normas nacionales y evaluar la viabilidad de recopilar datos acerca de los indicadores desarrollados.

#### ECUADOR

*Responder a las necesidades actuales de M&MRV, complementar el Programa Nacional Conjunto ONU-REDD (NJP) de Ecuador, para respaldar el despliegue de un sistema nacional de inventario de GHG.*

*(Producto de NJP 1.4); apoyo para completar la estrategia nacional de REDD + y su plan de acción y comenzar su implementación; apoyo para establecer y/o fortalecer los marcos institucional, de políticas, legal y operativo; apoyo para completar el diseño de SIS y el desarrollo de sumarios de salvaguardas. (MRV&M, SE, GOB, SF&MB, GE&PS)*

#### **Pedidos por un importe total de US\$ 904.000 fueron aprobados en 2014 y 2015.**

TS1 aprobado en sep de 2014 (US\$ 225.800).

TS2 aprobado en enero de 2015 (US\$ 528.200), TS3

aprobado en junio de 2015 (US\$ 150.000).

TS1: 72%, TS2: 0%, TS3: 0% de entrega.

#### **Resultados clave y progreso de enero a junio 2015**

##### **TS1, R1-2:**

- Automatización de casi el 40% en el proceso de productos cartográficos en la UNIDAD de monitoreo del Departamento de Herencia Natural.
- Se diseñó el sistema nacional de inventario de GHG (estimaciones para la agricultura y el año base 2010 de LULUFC en el inventario de GHG).

**TS2, R1-2:** en la fase inicial.

##### **TS2:**

- **R2a:** Progreso en materia de sub-componentes de salvaguardas de la estrategia nacional de REDD+: se identificaron los objetivos, indicadores y resultados previstos, además de las acciones necesarias para fomentar y respetar las salvaguardas e implementar el SIS.
- **R2b:** se identificaron y ajustaron los criterios de salvaguardas y los requisitos de información de SIS para los instrumentos de implementación de REDD+ vinculados a los marcos institucional, legal, de políticas y financiero.
- **R3a:** Mapeo actualizado de los sistemas nacionales de información relevantes para el informe de SIS/el desarrollo del resumen de información (Sol), de importancia vital para completar el desarrollo y comenzar la implementación del SIS, incluso arreglos institucionales para su funcionamiento.
- **R3b:** Se apoyaron diversas reuniones y talleres técnicos con actores nacionales, con énfasis en las recomendaciones de recopilación de datos para abordar y respetar las salvaguardas durante la implementación de la estrategia nacional de REDD+.
- **R3c:** Se recopiló y evaluó información para actualizar la propuesta para el primer Sol, para cubrir la fase de estado de preparación para REDD+.

- **R3d:** Se progresó en las actividades de salvaguardas de REDD+ y en los resultados previstos, según lo solicitó MAE: desarrollo y revisión de los documentos de comunicaciones de SIS, comentarios sobre la vinculación de salvaguardas a otros procesos de REDD+, con aportes técnicos para los informes/documentos técnicos.

## ETIOPÍA

*Apoyo para fomentar el proceso para alcanzar el estado de preparación para REDD+ y apoyo para alcanzar los resultados siguientes: Informe de análisis del contexto institucional; mapa de ruta que vincula el valor de los bosques de Etiopía a su cuenta nacional; visitas de intercambio de aprendizaje; informe de lecciones aprendidas documentadas y reunión de cierre; análisis de la situación de preparación para REDD+ regional e informes de progreso; y un mapa de ruta que vincule el valor de los bosques de Etiopía a su cuenta nacional. Además, apoyo del estudio de evaluación socioeconómica. (GOB, SE, GE&PS)*

### **Pedidos por un importe total de US\$ 346.500 aprobados en 2014 y 2015.**

TS1 aprobado en oct 2014 (US\$ 330.000).

TS2 aprobado en abril de 2015 (US\$ 16.500).

TS1: 31%, TS2: 68% de entrega.

### **Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

#### **TS1 y TS2:**

- **R1:** Se completaron los términos de referencia y se reclutó un consultor para el análisis institucional y de contexto (ICA).
- **R2:** Taller inicial para lanzar la evaluación socioeconómica del ecosistema forestal de Etiopía lanzado el 15 de abril de 2015. 30 representantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales fueron consultados acerca del alcance y la disponibilidad de datos para la evaluación de la contribución del sector forestal y los ecosistemas forestales a la economía nacional de Etiopía. Enlace a los medios en el sitio web de ONU-REDD y African Review.
- **R3:** Términos de referencia completados y consultor contratado para elaborar el mapa de ruta. El taller inicial tuvo lugar los días 15 y 16 de abril.
- **R5:** Para analizar el estado de preparación regional para REDD+, se ha seleccionado una región piloto y tuvo lugar en la región una misión para determinar el alcance en colaboración con autoridades

federales (asesor del ministro y coordinador de REDD+), con la participación del gobernador y ministerios regionales.

## GHANA

*Apoyo para compartir información a intervalos regulares y concientización de las partes interesadas sobre las áreas técnicas comunes entre REDD+ y FLEGT, y fomento de la participación en la coordinación entre procesos. (GOB)*

### **Un pedido de US\$ 40.000 aprobado en mayo de 2013.**

100% de entrega.

### **Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- El Gobierno presentó el informe de mitad de período que incluyó todos los elementos exigidos clave. Entre estos elementos, cabe mencionar una revisión del material publicado, las entrevistas de partes interesadas, la realización de dos seminarios sobre sinergias de REDD+ y FLEGT, y el desarrollo y la distribución de boletines informativos mensuales. Queda por organizar el taller de validación final, con miras a recopilar aportes de las partes interesadas y adoptar un plan de trabajo sobre las sinergias de FLEGT y REDD+. Para diciembre de 2015 se habrá completado un informe final.

## GUATEMALA

*Apoyo para el fomento de la capacidad en materia de aspectos legales de REDD+ mediante la evaluación de la legislación existente sobre la tenencia de tierras y los derechos de propiedad vinculados a bienes y servicios ambientales. (GOB)*

### **Un pedido de US\$ 21.000 aprobado en agosto de 2013.**

100% de entrega.

### **Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- Apoyo específico completado
- El análisis legal detectó brechas e incoherencias en la ley de cambio climático adoptada por Decreto en 2013, en relación a REDD+ y los aspectos de tenencia de tierras.
- Recomendaciones sobre reformas legales concentradas en la necesidad de aclarar los derechos a la tenencia de la tierra y derechos de carbono, así como también mecanismos para compartir beneficios y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas (en relación con la ley del

cambio climático, se adoptarán reglamentos específicos de acuerdo con la ley).

- Reformas propuestas en relación con la nueva ley de bosques, en particular, aclaración de la terminología vinculada a los servicios ambientales y los beneficios compartidos (se ha realizado la validación).

#### HONDURAS (NP)

*Apoyo a un marco legal para REDD+ bajo la Ley de Bosques, Áreas Protegidas y Vida Salvaje. Apoyo a la facilitación de la participación de partes interesadas para actualizar la propuesta para alcanzar el estado de preparación para REDD+. (GOB, SE)*

#### Pedidos por un importe total de US\$ 70.000 aprobados en 2013.

TS1 aprobado en sep de 2013 (US\$ 25.000).

TS2 aprobado en sep 2013 (US\$ 45.000).

TS1: 100%, TS2: 42% de entrega.

- **TS1:** Completado.
- **TS2:** Sin resultados que comunicar por el momento en materia del trabajo en un mecanismo para abordar quejas.

#### INDONESIA (NP)

*Apoyo para ingresar a la fase de implementación de la evaluación de la gobernanza participatoria. (GOB)*

#### Pedidos por un importe total de US\$ 866.329 aprobados en 2013-2014.

TS1 aprobado en feb 2013 (US\$ 325.000), TS2 2013

(US\$ 46.729), TS3 aprobado en jun 2013 (US\$

150.000), TS4 aprobado en jun 2014 (US\$ 344.600).

TS1-TS3: 100%, TS4: 96% de entrega.

TS1-TS3 completados.

#### Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:

- **TS4:** El 21 de mayo, el Ministerio del Medio Ambiente y Forestación de Indonesia lanzó en Jakarta dos informes para difundir la Estrategia Nacional de REDD+ y una mejor gobernanza de bosques para REDD+. Los informes son : i) el Índice de Gobernanza Forestal de Indonesia que se apoya en la primera Evaluación de Gobernanza Participatoria (PGA) para proporcionar información sobre la certidumbre de áreas forestales, la ecuanimidad en cuanto a recursos forestales, la transparencia e integridad en la gestión de bosques y la capacidad para hacer valer la ley; y ii) una Evaluación de su sistema de licencias para bosques por Internet ([www.tinyurl.com/indonesia-forest-license](http://www.tinyurl.com/indonesia-forest-license)) que

recibió 160 solicitudes de licencias para bosques y visitas de proveedores para identificar, a través de 11 indicadores, problemas de ineficiencia y prácticas corruptas en el proceso de solicitud y obtención de licencias para bosques.

#### KENYA

*Apoyo para tareas anti-corrupción, derechos de carbono y beneficios compartidos; un taller y un panel de alto nivel sobre las inversiones en bosques en la economía verde; un análisis del marco legal vinculado a los bosques relevante para REDD+; redacción de las disposiciones de REDD+ para aclarar y regular los principales problemas legales de REDD+ priorizados por el gobierno, con especial atención a los problemas de tenencia de tierras y de carbono; mapeo para apoyar la planificación del uso de tierras para REDD+, incluso beneficios múltiples; estudio de viabilidad sobre oportunidades vinculadas con REDD+ para mejorar la eficiencia de las operaciones forestales y el procesamiento de productos forestales. (MRV&M, GOV, SF&MB, GE&PS)*

#### Pedidos por un importe total de US\$ 966.585 aprobados en 2012-2014.

TS1 aprobado en ago 2012 (US\$ 175.800), TS2

aprobado en nov 2013 (US\$ 250.000), TS3 aprobado

en jun 2014 (US\$ 541.585).

TS1: 86%, TS2: 15%, TS3: 41% de entrega.

TS1 completado.

#### Resultados clave y progreso en ene-jun 2015: TS2:

- El estudio financiero ha comenzado y, según se espera, contribuirá al proceso de Política financiera nacional del clima. Se ha establecido un grupo de trabajo con la participación del Tesoro.
- El Código de Conducta del Servicio Forestal de Kenya (KFS) ha sido examinado por la Fuerza de Tareas Anticorrupción para REDD+ y, según se prevé realzará la integridad del y contribuirá a mejorar la gobernanza de recursos forestales. Es la primera vez que el código KFS se abre a otras partes interesadas.
- Campañas de concientización de partes interesadas que apuntan a cuatro países, lanzadas para aumentar la conciencia y alcanzar responsabilidad y apoyo para todas las iniciativas anti-corrupción lanzadas por el Gobierno.
- Desarrollo en curso de dos pautas independientes para obtener el compromiso de las partes interesadas y consentimiento libre, previo e informado (FPIC). Estas últimas serán las primeras



desarrolladas por una organización indígena en un contexto de REDD+ en África.

- **TS3:** Las actividades de mapeo de la cobertura de tierras han sido completadas y se cuenta con estadísticas para la detección de cambios, aunque se necesitan mejoras ulteriores, incluso la validación de campo.

#### **TS4:**

- **R3-4:** Se celebraron dos reuniones del grupo de trabajo técnico nacional sobre MRV, para mejorar la coordinación entre actores y, en particular, con el programa de un sistema de estimación de emisiones con base en tierra de Kenya (SLEEK).
- El plan de trabajo sobre el estado de preparación legal ha sido aprobado y se han seleccionado seis políticas y decretos para integrar consideraciones de REDD+ basadas en consultas con las partes interesadas relevantes.
- **R5-6:** Se ha desarrollado una versión preliminar de un informe sobre la planificación del uso de tierras para REDD+, focalizada en el mapeo de los beneficios múltiples de REDD+ y las áreas prioritarias para la implementación de acciones de REDD+, que incluye 25 mapas y diversos colaboradores. El taller de validación planificado para julio también abordará formas potenciales para utilizar los resultados para la planificación de REDD+ y más allá.

#### **MADAGASCAR**

*Apoyo a las reformas legales y normativas y a la organización del diálogo con partes interesadas y sectores múltiples sobre el diseño de la estrategia nacional. (GOB, SE)*

**Un pedido de US\$ 175.000 aprobado en agosto de 2014.**

25% de entrega.

#### **Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- **R1,2,6:** El informe sobre el análisis final de PLR y el mapa de ruta resultante, que han sido completados, identifican oportunidades inmediatas para modificar/mejorar la legislación y las políticas a fin de alcanzar una inclusión mayor de las consideraciones y los temas vinculados con REDD+. Se recomiendan acciones específicas para tomar en cuenta REDD+ de inmediato en el próximo Código de Política Forestal y Forestación. Otras recomendaciones cubren sectores no forestales para integrar las consideraciones de REDD+.

- **R3,4,5:** A partir de las lecciones aprendidas en el marco de CNA, se ha reorganizado el flujo de trabajo y, en particular, sobre la base del informe sobre la evaluación de necesidades vinculadas al diálogo intersectorial y a la visión nacional.
- Madagascar ha iniciado un proceso intersectorial consultivo, amplio e inclusivo para la visión nacional de REDD+ con el apoyo del Programa. Se redactó un informe que estableció una base para la reorientación fundamental de la visión nacional de REDD+, con la incorporación plena de REDD+ a la estrategia nacional y rural de desarrollo y el aporte de elementos importantes para actualizar el proceso de diseño de estrategias con un diálogo intersectorial y a nivel de políticas muy mejorado.

#### **MALAWI**

*Apoyo a una revisión del entorno legal y de políticas, un mapa de ruta de NFMS, un análisis de contexto institucional, una estrategia de compromiso y participación de partes interesadas y una evaluación del riesgo de corrupción. (MRV&M, GOB)*

**Un pedido de US\$ 250.956 aprobado en diciembre de 2014.** 50% de entrega.

#### **Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- Se ha alcanzado la armonización del apoyo específico y CNA a través de una sólida cooperación entre los distintos organismos. Un taller inicial, organizado en abril de 2015, contó con la asistencia de más de 100 participantes del gobierno, la sociedad civil y las organizaciones basadas en la comunidad, además del sector privado.
- **R1-4:** Se están estudiando aspectos analíticos clave, a saber, evaluación del marco legal y de políticas, análisis institucional y de contexto, evaluación del riesgo de corrupción y evaluación de la tenencia de tierras.
- **R5:** Se están desarrollando un mapa de ruta para la estrategia nacional de REDD+, una estrategia de gestión de conocimientos y un sistema nacional de monitoreo de bosques.
- El mapa de ruta de NFMS está disponible en versión preliminar.

#### **MÉXICO**

*Apoyo al desarrollo de los sistemas nacionales de salvaguarda, entre ellos los sistemas nacionales de información sobre salvaguardas mediante los análisis relevantes restantes y el estímulo de*

*acuerdos necesarios para consolidar el modelo conceptual de SN y el diseño del SIS. (SG&MB)*

#### **Un pedido de US\$ 650.000 aprobado en agosto de 2014.**

12% de entrega.

#### **Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- La Comisión Nacional Forestal de México o CONAFOR aumentó sus capacidades de coordinación e implementación de salvaguardas mediante la contratación de un consultor dentro de la CONAFOR REDD+ y un equipo de salvaguardas (a partir de abril de 2015) y apoyo remoto relacionado.
- El país progresó hacia una comprensión común y una consolidación de las capacidades en materia de salvaguardas y sistemas de información sobre salvaguardas a través de debates y sesiones de trabajo a nivel subnacional, y a través de consultas públicas sobre la estrategia nacional de REDD+ (con representantes de 32 estados)
- **R1:** Se está elaborando el diseño de SIS, incluso una evaluación que está en curso y cubre los sistemas y las fuentes de información existentes por PLR, tras haberse seleccionado un PLR al que se ha dado prioridad para iniciar el trabajo; se están analizando los sistemas de información, los mecanismos de comunicación y los indicadores existentes para identificar información que será utilizada en el SIS para proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas de REDD+, en consulta con partes interesadas clave de la sociedad civil e instituciones gubernamentales.
- Un área del marco de PLR fue analizada en términos de la información disponible; hay varias instituciones gubernamentales que están recopilando información relevante que se podría utilizar para el SIS.
- Se estableció un panel sobre el sistema nacional de salvaguardas (NSS) y SIS para crear espacio para información y diálogo, además de recomendaciones de 42 participantes de la sociedad civil, el mundo académico y el gobierno
- 'Diseño de un documento de NSS publicado que incluye los pasos siguientes para el NSS.

#### **MONGOLIA**

*Apoyo al desarrollo del plan de acción para NFMS para REDD+: desarrollo de sistemas de monitoreo satelital de bosques; rediseño de la metodología del inventario nacional forestal; gobernanza y*

*salvaguardas sociales; desarrollo de la capacidad institucional del organismo forestal e identificación de opciones potenciales para beneficios equitativos y transparentes; opciones para abordar los factores que impulsan la deforestación y la degradación de bosques; coordinación y colaboración sectoriales para REDD+ identificadas e implementadas; herramientas de apoyo para decisiones de espacio para que la planificación de REDD+ contribuya a proporcionar beneficios múltiples y reducir los riesgos potenciales; fomento de la capacidad de las partes interesadas nacionales en materia de planificación integrada, análisis espacial y sistemas de información para apoyar al sector forestal y la planificación de REDD+ que incorpora múltiples beneficios y salvaguardas ambientales. (MRV&M, GOB, SG&MB)*

#### **Pedidos por un importe total de US\$ 576.200 aprobados en 2012 y 2014.**

TS1 aprobado en jul 2012 (US\$ 185.500), TS2 aprobado en jun 2014 (US\$ 220.000), TS3 aprobado en oct 2014 (US\$ 170.700).

TS1: 114%, TS2: 7 %, TS3: 21% de entrega.

TS1 completado.

#### **Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

##### **TS2:**

- Se elaboró un informe inicial a partir de la evaluación de la deforestación y la degradación forestal, y el fomento del potencial y de la capacidad frente a los requisitos internacionales. Se esperan informes finales validados por las partes interesadas para fines de septiembre de 2015. El Programa Nacional comenzará a principios de octubre y, en consecuencia, los elementos que deben entregarse en el marco del apoyo específico serán utilizados de inmediato para la priorización y creación de arreglos institucionales.
- Plan de acción de NFMS endosado por el Gobierno de Mongolia
- Se fomentó la capacidad del Sistema satelital de monitoreo de tierras (SLMS) con una misión de apoyo técnico sobre SLMS en marzo.
- Se fomentó la capacidad de GHG con una capacitación técnica sobre GHG realizada en marzo para 6 expertos (83% mujeres), de cinco instituciones nacionales.
- **TS3:** Este trabajo comenzó formalmente en mayo de 2015 con una misión de planificación a Ulaanbaatar y se inició la finalización del plan de

trabajo y la recopilación de datos espaciales existentes.

## MYANMAR

*Apoyo al proceso de consultas a la luz del desarrollo del mapa de ruta, el proceso de consulta vinculado con MRV y NFMS, el compromiso de partes interesadas y la toma de conciencia de REDD+; arreglos de gobernanza efectiva y participatoria para REDD+ - definición de salvaguardas de REDD+ y desarrollo del sistema nacional de información sobre salvaguardas; desarrollo preliminar de REL/RL y NFMS; y desarrollo de la estrategia nacional de REDD+. (MRV&M, GOB, SG&MB)*

**Pedidos por un importe total de US\$ 1.243.000 aprobados en<sup>4</sup>2013 y 2014.**

TS1 aprobado en feb 2013 (US\$ 128.000), TS2 aprobado en mayo 2014 (US\$ 1.115.000).

TS1: 34%, TS2: 17% de entrega.

TS1 completado.

**Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**  
**TS2:**

- El Pacto de pueblos indígenas asiáticos (AIPP) apoyado, en colaboración con La promoción de indígenas y la naturaleza juntos (POINT), realizaron en mayo una reunión preparatoria de dos días que congregó a representantes de pueblos indígenas, y un diálogo nacional de un día con el Departamento de Bosques de Myanmar. Participaron 33 indígenas. Los participantes plantearon sus inquietudes y hicieron recomendaciones que fueron presentadas durante los diálogos con el Departamento de Bosques. La reunión nacional también ofreció una plataforma para establecer vínculos entre líderes y representantes de organizaciones y comunidades indígenas; para muchos fue la primera reunión y se comprometieron a trabajar en colaboración sobre REDD+ y problemas relacionados. En particular, los participantes acordaron consolidar y utilizar el Foro de pueblos indígenas de Myanmar, una entidad existente, para monitorear el proceso de REDD+ y formar un grupo de trabajo de pueblos indígenas sobre REDD+ dentro del foro.
- Empezó el trabajo inicial sobre un SIS social y ambiental, que aprovecha el marco de REDD SES.
- La oficina del proyecto de apoyo específico de ONU-REDD, que se estableció en el Departamento de Bosques, trabaja en estrecha colaboración con

el departamento y las partes interesadas en la elaboración de planes de acción de FREL/FRL y NFMS.

- Se realizó una evaluación de necesidades de capacidad tomando como punto de partida 15 importantes criterios relevantes para el desarrollo de FREL y NFMS
- Se desarrolló el primer borrador del plan de acción de NFMS.
- Se realizaron sesiones de capacitación en NFI/NFM para el personal técnico del FD en el FSI en Dehra Dun, India.
- Primer taller nacional de FREL completado (35 participantes, 20 hombres, 15 mujeres); se desarrollaron los elementos esenciales para el plan de acción de FREL.
- Dinámica de la participación de partes interesadas: se la reinició para trabajo de NFMS y FREL (grupo de MRV).

## NEPAL

*Apoyo del monitoreo de PAM mediante el uso de indicadores Proxy y PLR y revisión institucional; opciones de estrategia de REDD+ y gestión de fondos de REDD+ a nivel nacional; contabilidad de capital natural para el sector forestal en Nepal y coordinación de actividades de TS. (MRV&M, GOB, GE&PS)*

**Pedidos por un importe total de US\$ 924.830 aprobados en 2012 y 2014.**

TS1 aprobado en 2012 (US\$ 85.000), TS2 aprobado en junio de 2014 (US\$ 759.830), TS3 aprobado en febrero de 2015 (US\$ 80.000).

TS1: 65%, TS2: 45%, TS3 0% de entrega.

TS1 completado.

**Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**  
**TS2:**

- **R3:** Han comenzado los reconocimientos de campo para apoyar la estimación de los servicios de ecosistemas de bosques.
- **R4:** Informe sobre PLR y marco institucional: se lo completó y presentó al Centro de implementación de REDD+ Implementation Centre.
- **R5:** Se realizó taller distrital con la participación de diversas partes interesadas sobre el análisis de impulsores y soluciones y se redactaron intervenciones potenciales para un plan de acción distrital de REDD+ (DRAP).

<sup>4</sup> Además, apoyo en especie

## PAKISTÁN

*Apoyo del mapa de ruta para alcanzar el estado de preparación para REDD+; desarrollo de la capacidad para la implementación del plan de acción de MRV; estado de preparación para REDD+ a través de mayores conocimientos y mayor capacidad en relación al marco legal e institucional a los niveles nacional y provincial (estado de preparación legal); y fomento de la comprensión de la tenencia de tierras. (MRV&M, GOB)*

### **Pedidos por un importe total de US\$ 167.000 aprobados en 2012 y 2014.**

TS1 aprobado en 2012 (US\$ 107.000), TS2 aprobado en noviembre de 2014 (US\$ 60.000).

TS1: 115%, TS2: 0% de entrega.

TS1 completado.

### **Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

#### **TS2:**

- Plan de Acción NFMS elaborado.
- Se realizó un taller de capacitación para 35 personas (14% mujeres) sobre el inventario de GEI.

para el monitoreo de bosques por parte de la comuna. Se identificaron territorios para desarrollar los proyectos piloto. Comenzó el proceso de compra de equipos para el monitoreo comunitario en territorios indígenas.

- **TS1+TS2, R5:** Se analizaron los datos recopilados en la fase piloto del inventario forestal y de carbono nacional (INFC). Los resultados de la fase piloto se presentaron y analizaron con MIAMBIENTE y socios clave, así como también las opciones de diseño final y las recomendaciones para el INFC.
- **TS2:** Se espera que las actividades de GE&PS comiencen durante la segunda mitad de 2015.

## PARAGUAY

*Apoyo a la plataforma de difusión en la web (versión beta) del sistema nacional de monitoreo de bosques en Paraguay (MRV&M)*

### **Un pedido de US\$ 100.000 aprobado en 2012.**

93% de entrega.

- No hay actividades en curso: apoyo específico completado e informado.

## PANAMÁ

*Apoyo para completar el NFMS del país; comenzar el monitoreo de bosques a nivel comunitario, fomentar la inversión directa en actividades de reducción de las emisiones, identificación de opciones de financiamiento de la economía verde para estimular la demanda de REDD+. (MRV&M, GE&PS)*

### **Pedidos por un importe total de US\$ 392.400 aprobados en 2014 y 2015.**

TS1 aprobado en agosto de 2014 (US\$ 95.000), TS2 aprobado en diciembre de 2014 (US\$ 250.000) y TS3 aprobado en enero de 2015 (US\$ 47.400).

TS1: 100%, TS2: 31%, TS3: 11% de entrega.

### **Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- **TS1+TS2, R1:** Versión final de la propuesta de un protocolo comunitario de propiedad intelectual que cubra los conocimientos tradicionales de especies florísticas y recolección de especímenes herbarios en territorios indígenas. La versión preliminar fue revisada por personal técnico indígena y no indígena y aprobada por las autoridades de COONAPIP. El documento será presentado a autoridades indígenas tradicionales para obtener sus recomendaciones finales.
- **TS1+TS2, R3:** Se realizaron sesiones de capacitación sobre GIS y detección remota con técnicos indígenas de distintas áreas indígenas (8 al 19 de junio), incluso teoría y práctica de campo

## PERÚ

*Apoyo del sistema de clasificación del uso de tierras armonizado en Perú; iniciativas de integración tendientes al monitoreo de multipropósitos de bosques; módulo de herramientas de cálculo "Open Foris Calc" para inventarios forestales; Sistema Nacional de Información Forestal; reglamentación de la ley de bosques y vida salvaje; lineamientos para los usuarios de la ley y el reglamento de bosques y vida salvaje; capacitación para REDD+, específicamente, el contexto peruano, los pueblos indígenas y otras partes interesadas locales vinculadas a bosques; generar demanda de REDD+; herramientas para la participación del sector privado en la conservación de bosques y REDD+; y apoyo de los modelos de negocios para el sector privado en servicios de conservación de ecosistemas y REDD+. (MRV&M, GOB, SE, SG&MB, GE&PS)*

### **Pedidos por un importe total de US\$ 1.070.763 aprobados en 2012 y 2014.**

TS1 aprobado en 2012 (US\$ 145.000), TS2 aprobado en octubre de 2014 (US\$ 925.763).

TS1: 96%, TS2: 39% de entrega.

TS1 completado.

### **Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

#### **TS2:**

- Plan de comunicaciones en la fase de preparación.
- Estrategia de fomento de capacidades en materia de REDD+ y gestión de bosques: (1) La versión preliminar del primer mapeo de partes interesadas ha sido completada; (2) primera nota conceptual sobre la estrategia objeto de consultas con el Comité Director del Proyecto; (3) se completó la primera versión del plan de género; y (4) se acordaron los tópicos que cubrirán la estrategia y los formatos de CB con el gobierno (GoP) y organizaciones de pueblos indígenas.
- Fondo de cambio climático y bosques: (1) El primer diseño general del fondo ha sido terminado; (2) se realizaron consultas con contrapartes nacionales sobre el diseño y las opciones para la entidad fiduciaria; (3) se llegó a acuerdos sobre el diseño financiero para implementar la declaración de intención Perú-Noruega/Alemania (Dol); (4) el mecanismo financiero “interino” para implementar la Dol se encuentra en las últimas etapas de definición (seguirá el proceso de diligencia debida); y (5) comenzó el análisis legal para completar el arreglo financiero “final”; la intención es completarlo hacia fines de 2015.
- Propuesta para arreglos institucionales para SIS: (1) alcance de la actividad que se clarifica con GoP; (2) versión preliminar de los términos de referencia propuesta.

#### FILIPINAS

*Apoyo al desarrollo de un programa de fomento de la capacidad para el suministro de información sobre salvaguardas a nivel local; desarrollo de las opciones de desarrollo del estado de preparación para REDD+ para la distribución de beneficios; y hacer frente a los riesgos de corrupción.*  
(GOB, SG&MB)

**Un pedido de US\$ 131.000 aprobado en 2012.**

98% de entrega.

- **No hay actividades en curso:** apoyo específico completado e informado.

#### SUDÁN MERIDIONAL

*Apoyo para aumentar la participación de partes interesadas en la gobernanza de bosques y REDD+ en respuesta a necesidades técnicas y de capacidad específicas identificadas por el país para consolidar el estado de preparación para REDD+ a nivel nacional*  
(GOB)

**Un pedido de US\$ 46.729 aprobado en marzo de 2013.**

76% de entrega.

- No hay actividades en curso: apoyo específico completado e informado.

#### SRI LANKA

*Apoyo a la propuesta de preparación para REDD+; desarrollo del plan de acción de MRV y apoyo para la consolidación de la inclusión de la mujer y para abordar consideraciones de género en los procesos de políticas de REDD+ al establecer un sub-grupo de género dentro del Foro CSO de REDD+ de Sri Lanka.*  
(MRV&M, SE)

**Pedidos por un importe total de US\$ 43.900 aprobados en 2012 y 2014.**

TS1 aprobado en 2012 (US\$ 4.000), TS2 aprobado en junio de 2012 (US\$ 9.900), TS3 aprobado en febrero de 2014 (US\$ 30.000).

TS1-TS2: 110%, TS3: 0% de entrega.

TS1 y TS2 completados

**Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- **TS3:** Fase de preparación: reclutamiento de dos expertos nacionales en género que respaldarán la implementación. Proyecto prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2015

#### REPÚBLICA DE SUDÁN

*Apoyo para el fomento de la capacidad en aspectos técnicos de REDD+, mediante la realización de una evaluación de las necesidades iniciales de REDD+ y el apoyo de la elaboración de un mapa de ruta para el trabajo que se ha de realizar para la preparación para REDD+.* (SG&MB, GE&PS)

**Un pedido de US\$ 27.900 aprobado en junio de 2014.**

107% de entrega.

- No hay actividades en curso: apoyo específico completado e informado.

#### SURINAM

*Apoyo para consolidar los marcos para la implementación de políticas y medidas de REDD+; CCDA asumirá la función de liderar el proceso para alcanzar el estado de preparación para REDD+ de Surinam; una revisión de los arreglos institucionales propuestos en R-PP con recomendaciones para un mecanismo interino/formal de reparación de quejas; una revisión del documento del proyecto de R-PP*



*referente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su "Dictamen Saramaka". (GOB, SE)*

**Pedidos por un importe total de US\$ 165.000 aprobados en 2012 y 2013.**

TS1 aprobado en agosto de 2012 (US\$ 100.000), TS2 aprobado en septiembre de 2013 (US\$ 65.000).

TS1: 86%, TS2: 29% de entrega.

- No hay actividades en curso: apoyo específico completado e informado.

**TÚNEZ**

*Apoyo de la situación de bosques y tierras de pastoreo y repercusiones para REDD+; desarrollo de un plan de trabajo para responder a los retos de REDD+ de la tierra y respaldo del desarrollo de una estrategia de REDD+ para el país. Apoyo del plan director de alcantarillado para la situación de tierras, desarrollado dentro del marco de la estrategia nacional para el desarrollo y la gestión sostenible de bosques y cadenas de montañas, incluso consideraciones específicas de REDD+. Respaldo para el refuerzo de la capacidad de técnicos e ingenieros y la participación y concientización de partes interesadas. (GOB)*

**Un pedido de US\$ 79.500 aprobado en enero de 2015.**

27% de entrega.

**Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- El taller inicial nacional se realizó en junio, conjuntamente con la reunión inicial de CNA y contó con la presencia de representantes de Argelia, Marruecos y El Líbano para fomentar la colaboración regional. El taller presentó el alcance del trabajo, recogió los comentarios de los participantes y también ofreció la oportunidad de analizar la Guía de Voluntarios para la Tenencia de Tierras y su relación con REDD+. Se desarrolló la metodología de investigación y han comenzado el trabajo de revisión de oficina y las consultas.

**UGANDA (NP)**

*Apoyo para la identificación, la priorización y el mapeo de beneficios múltiples, además del desarrollo de salvaguardas y SIS. (SF&MB)*

**Un pedido de US\$ 75.000 aprobado en abril de 2014.**

0% de entrega.

**Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- **R1:** La identificación de la lista preliminar de prioridades para los beneficios mutuos está en

curso; esta lista servirá de punto de partida para el desarrollo de los términos de referencia para una sesión de fomento de la capacidad en análisis espacial para la planificación de REDD+.

- **R2:** Consultas realizadas en el marco de un taller celebrado en Kampala sobre las salvaguardas y el mapa de ruta de SIS de Uganda, para el Comité Técnico Nacional (NTC) y para miembros específicos de otras instituciones, otros ministerios, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
- **R3:** Se estableció una mesa de ayuda técnica vinculada con salvaguardas y beneficios múltiples y se proporcionó apoyo.

**VIET NAM**

*Apoyo para ingresar a la fase inicial de la evaluación de la gobernanza participativa. (GOB)*

**Un pedido de US\$ 116.000 aprobado en 2012.**

100% de entrega.

- No hay actividades en curso: apoyo específico completado e informado.

**ZAMBIA (NP)**

*Apoyo para mejorar la calidad de la evaluación del cambio de la cobertura de tierras y para establecer un nivel de referencia de emisiones para el sector forestal/niveles de referencia forestal en Zambia (MRV&M)*

**Un pedido de US\$ 40.000 aprobado en septiembre de 2014.**

66% de entrega.

**Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- La evaluación del cambio de la cobertura de tierras se completó y los mapas del cambio están listos. Los resultados estarán disponibles en breve, una vez finalizados la evaluación de la exactitud y el control de calidad.
- 'Los beneficios de los ecosistemas forestales en Zambia y el papel que le cabe a REDD+ en la transformación de una economía verde fueron analizados con representantes de alto nivel del Gobierno de Zambia en el transcurso de una reunión celebrada en Lusaka el 28 de abril de 2015. Las conclusiones del informe se incluyeron en un informe de 'problemas y opciones' que servirá de punto de partida para el desarrollo de una estrategia nacional de REDD+ para Zambia. Enlace a medios en el sitio web de ONU-REDD.

## PEDIDOS REGIONALES/DE VARIOS PAÍSES

### PNG E ISLAS SALOMÓN

*Apoyo del desarrollo de una propuesta para una estructura de apoyo regional para el monitoreo y la medición de bosques en el Pacífico. (MRV&M)*

**Un pedido de US\$ 100.000 aprobado en junio de 2012.** 112% de entrega.

- No hay actividades en curso: apoyo específico completado e informado.

### ISLAS DEL PACÍFICO

*Apoyo al Pacífico para establecer el monitoreo de bosques y recursos para el apoyo de inventarios forestales, con capacitación de contrapartes gubernamentales de PIC. (MRV&M)*

**Un pedido de US\$ 1.415.000<sup>5</sup> fue aprobado en abril de 2014.**

70% de entrega.

**Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

**Consideraciones generales:**

- El proyecto comenzó en mayo de 2014 y ha entregado 8 talleres regionales, 4 talleres nacionales y 4 misiones de respaldo, con 285 participantes involucrados, provenientes de 11 países isleños del Pacífico durante el primer año de funcionamiento. Esto ha dado lugar a 1445 días de capacitación para los países participantes.
- La entrega de proyectos se ha realizado a través de tres arreglos de colaboración con la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, División de Recursos de Tierras (SPC-LRD), la Secretaría de la Comunidad del Pacífico para Geociencias (SPC-SOPAC) y el Gobierno de las Islas Salomón.

**Los resultados clave para el primer año de implementación del proyecto son:**

- Se han establecido un inventario forestal regional e instalaciones de monitoreo de bosques;
- Una red regional de técnicos en inventarios forestales (con una lista para el envío de correo electrónico y un sitio web asociado)

- Un esquema regional de clasificación del uso de tierras (LUCS) ha sido desarrollado y adoptado por PIC
- Un sistema regional de monitoreo forestal ha sido desarrollado y documentado;
- Fiji, Islas Salomón y Vanuatu han logrado generar de forma independiente datos sobre las actividades forestales nacionales para respaldar a) el desarrollo de sus sistemas nacionales de monitoreo forestal para REDD+ y b) el aporte de mejor información sobre la política y el proceso de toma de decisiones vinculadas uso de tierras;
- Fiji e Islas Salomón han adoptado el sistema regional de monitoreo forestal como componente SLMS de sus NFMS;
- El gobierno de las Islas Salomón ha desarrollado una propuesta de provisión de fondos para la implementación de su 'primer inventario forestal nacional', lo que incluye la estratificación de bosques y la intensidad del muestreo.

**Impactos/resultados:**

- Toma de conciencia y apoyo de los sistemas nacionales de monitoreo de bosques para REDD+ mejorados en la región;
- La capacidad de PIC de producir datos nacionales de forestación de alta calidad se ha mejorado, se ha apoyado la recolección de datos y se ha obtenido la participación de partes interesadas en los procesos de recopilación de datos.

### ISLAS DEL PACÍFICO

*Soporte regional a Fiji, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Vanuatu). Soporte para fomento de la capacidad para la construcción de FREL/FRL y versiones preliminares de FREL/FRL. (MRV&M)*

**Un pedido de US\$ 150.000 aprobado en enero de 2015.**

27% de entrega.

**Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:**

- Se implementaron un intercambio de conocimientos Sur-Sur y fomento de la capacidad en materia de FREL/FRL con un taller sub-regional que contó con la participación de expertos técnicos de Fiji, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Vanuatu (Vanuatu se vio obligada a cancelar su participación como consecuencia del ciclón PAM) y tuvo lugar en Nadi, Fiji. (16 participantes, 60% mujeres)
- Un mapa de ruta de FREL/FRL fue articulado para los países participantes, con un taller más de

<sup>5</sup> El apoyo regional incluye apoyo a Fiji, Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Palau, PNG, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

FREL/FRL realizado en los países participantes  
mismos en 2015.

#### **ÁFRICA OCCIDENTAL**

*Apoyo regional de ayuda a Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo). Respalda la consolidación de la capacidad regional en los inventarios nacionales de carbono forestal de África Occidental. (MRV&M)*

Un pedido de US\$ 162.000 aprobado en mayo de 2015.

0% de entrega.

Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:

- En la fase de preparación; el trabajo comenzará en agosto de 2015.




## 5.2 Apoyo técnico

Durante este período de seis meses, el respaldo a países socios alcanzó un total de US\$ 5 millones. Este notable apoyo, proporcionado por las organizaciones de la ONU participantes, constituyó una forme complementaria de respaldo a países con el Programa Nacional y actividades en países socios sin el Programa Nacional. Se brindó apoyo a 44 países en total; los que más recibieron en términos de costos de respaldo son de la región de África y de la región de Asia-Pacífico. (Figura 2)

De los cinco nuevos países socios que se sumaron al Programa ONU-REDD dentro del período cubierto, Vanuatu ya recibió respaldo técnico y apoyo específico.

En total durante el período de 2013 a 30 de junio de 2015, el importe de los costos de respaldo es de US\$ 23,3 millones. Del total de 61 países socios, 50 han recibido apoyo. También es relevante mencionar que se ha brindado apoyo de gestión de conocimientos<sup>6</sup> a todos los países socios.

**Figura 2.** Proporción de gasto de respaldo del 1 de enero al 30 de junio de 2015 a través de las regiones y cantidad de países apoyados.

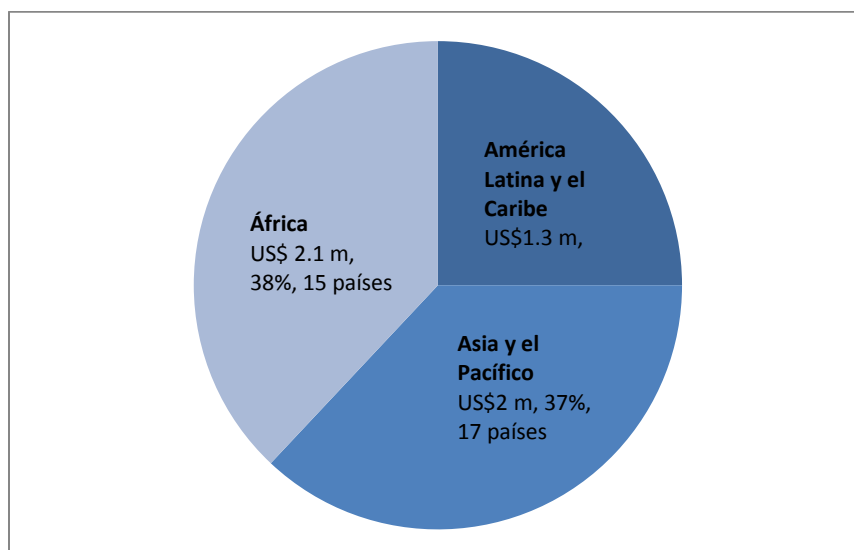

<sup>6</sup> El apoyo de conocimientos a países socios incluye la participación en talleres, sesiones de la Academia de REDD+ y acceso a los conocimientos de fomento de la capacidad técnica a través del espacio de trabajo de ONU-REDD.

## 6. Información financiera

La Tabla 2 ofrece información financiera a los niveles de Productos y Resultados y el desglose por organizaciones de la ONU participantes para el período 1 nov 2011 – 30 jun 2015 del AAN.

**Tabla 2.** Presupuesto y gasto del AAN de noviembre de 2011 a junio de 2015 a los niveles de productos y resultados y un desglose por organizaciones de la ONU participantes. (US\$)

Resultado del Programa (Referencia: Documento Marco del Programa Global de AAN)	Org. ONU Part.	Presupuesto aprobado 1 nov 2011 – 31 de diciembre de 2014	Presupuest o aprobado Ene-dic 2015	Presupuesto acumulativo aprobado 1 nov 2011 – 31 dic 2015	Gastos de años anteriores			Gastos ene - jun 2015 y compromisos <sup>7</sup>			Acumulativo: Gastos + compromisos (1 nov. 2011 - 30 jun 2015) (B+C+D+G)	Gastos + comp. / Presupue sto aprobado (%) (H/A)
					Noviembre 2011-2012 Gastos	2013 Gastos	2014 Gastos	Enero - junio Gastos 2015	Compromisos programáticos y financieros al 30 de junio	Gastos totales + comp. (E+F)		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Resultado 1: Los países de REDD+ cuentan con sistemas y capacidades para desarrollar e implementar los MRV y el monitoreo</b>												
<b>Producto 1.1:</b>	FAO	5.491.802	1.318.914	6.810.716	1.533.790	1.192.714	1.596.543	1.027.560	58.652	1.086.212	5.409.259	
<b>Producto 1.2:</b>	FAO	15.039.181	4.135.314	19.174.495	3.809.070	2.769.805	5.005.343	3.869.137	2.782.426	6.651.563	18.235.781	
	PNUD	577.000	170.782	747.782	290.759	169.342	175.021	68.425	69.138	137.563	772.685	
	PNUMA	135.000		135.000	122.307	12.692					134.999	
<b>Producto 1.3:</b>	FAO		2.739.705	2.739.705				374.501	2.245.006	2.619.507	2.619.507	
<b>Subtotal de Resultado 1</b>		<b>21.242.983</b>	<b>8.364.715</b>	<b>29.607.698</b>	<b>5.755.927</b>	<b>4.144.553</b>	<b>6.776.907</b>	<b>5.339.623</b>	<b>5.155.222</b>	<b>10.494.845</b>	<b>27.172.232</b>	<b>92%</b>
<b>Resultado 2: Se desarrollan sistemas nacionales inclusivos de gobernanza para la implementación de REDD+</b>												
<b>Producto 2.1:</b>	FAO	831.640	295.459	1.127.099	197.990	203.586	290.457	33.185	164.808	197.993	890.026	
	PNUD	3.310.198	417.724	3.727.922	802.655	556.151	915.608	343.690	326.551	670.241	2.944.655	
<b>Producto 2.2:</b>	PNUD	5.314.890	1.436.384	6.751.274	82.556	1.586.292	2.628.352	1.556.714	1.228.230	2.784.944	7.082.144	
<b>Producto 2.2 bis:</b>	PNUD		1.936.384	1.936.384					1.118.043	1.118.043	1.118.043	
<b>Producto 2.3:</b>	FAO	1.255.641	391.992	1.647.633	179.204	287.177	187.726	161.527	427.968	589.495	1.243.602	
	PNUMA	275.000		275.000			240.284	34.716		34.716	275.000	
<b>Producto</b>	PNUD	1.816.872	753.207	2.570.079	59.492	463.081	676.495	430.035	1.306.809	1.736.844	2.935.912	

<sup>7</sup> Estos son compromisos programáticos y financieros vinculantes formalizados por las agencias, que se desembolsarán en los períodos futuros.

Resultado del Programa (Referencia: Documento Marco del Programa Global de AAN)	Org. ONU Part.	Presupuesto aprobado 1 nov 2011 – 31 de diciembre de 2014	Presupuest o aprobado Ene-dic 2015	Presupuesto acumulativo aprobado 1 nov 2011 – 31 dic 2015	Gastos de años anteriores			Gastos ene - jun 2015 y compromisos <sup>7</sup>			Acumulativo: Gastos + compromisos (1 nov. 2011 - 30 jun 2015) (B+C+D+G)	Gastos + comp. / Presupue sto aprobado (%) (H/A)
					Noviembre 2011-2012 Gastos	2013 Gastos	2014 Gastos	Enero - junio Gastos 2015	Compromisos programáticos y financieros al 30 de junio	Gastos totales + comp. (E+F)		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>2.4:</b>												
<b>Producto 2.5:</b>	FAO	1.298.329	214.721	1.513.050	162.982	203.205	276.636	95.413	193.844	289.257	932.080	
<b>Producto 2.6:</b>	PNUD	2.299.243	345.240	2.644.483	593.838	541.581	623.215	218.085	486.446	704.531	2.463.165	
<b>Producto 2.7:</b>	FAO	998.113	825.114	1.823.227	197.090	373.072	160.493	248.793	645.732	894.525	1.625.180	
<b>Producto 2.8:</b>	PNUD	713.493	150.000	863.493	50.885	199.390	82.744	55.353	57.579	112.932	445.951	
<b>Subtotal de Resultado 2</b>		<b>18.113.419</b>	<b>6.766.225</b>	<b>24.879.644</b>	<b>2.326.693</b>	<b>4.413.535</b>	<b>6.082.010</b>	<b>3.177.511</b>	<b>5.956.010</b>	<b>9.133.521</b>	<b>21.955.759</b>	<b>88%</b>
<b>Resultado 3: Se consolidaron los sistemas nacionales para la gestión transparente, equitativa, creíble y responsable de los fondos de REDD+. (Gastos hasta el 31 de diciembre de 2012 solamente. Actividades de resultados interrumpidas)</b>												
<b>Producto 3.2:</b>	FAO	178.096		178.096	80.168						80.168	
<b>Producto 3.4:</b>	PNUD	247.305		247.305		30.807	69.347	1.511	9.694	11.205	111.359	
<b>Subtotal de Resultado 3</b>		<b>425.401</b>		<b>425.401</b>	<b>80.168</b>	<b>30.807</b>	<b>69.347</b>	<b>1.511</b>	<b>9.694</b>	<b>11.205</b>	<b>191.527</b>	<b>45%</b>
<b>Resultado 4: Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas tienen una participación efectiva en el proceso nacional e internacional de adopción de decisiones de REDD+, y el desarrollo y la implementación de estrategias.</b>												
<b>Producto 4.1:</b>	PNUD	1.466.917	384.879	1.851.796	128.041	95.156	260.658	141.877	197.335	339.212	823.067	
<b>Producto 4.2:</b>	PNUD	1.011.199	79.679	1.090.878	390.272	377.584	360.023	166.960	110.610	277.570	1.405.449	
<b>Producto 4.3:</b>	PNUD	2.273.280	1.253.650	3.526.930	69.958	663.577	762.393	342.851	807.639	1.150.490	2.646.418	
<b>Producto 4.4:</b>	PNUD	1.267.243	316.175	1.583.418	300.715	227.349	280.521	88.874	30.536	119.410	927.995	
<b>Producto PNUMA</b>	PNUMA	2.450.000	1.206.000	3.656.000	188.897	266.103	913.579	1.081.422	1.044.511	2.125.933	3.494.512	

Resultado del Programa (Referencia: Documento Marco del Programa Global de AAN)	Org. ONU Part.	Presupuesto aprobado 1 nov 2011 – 31 de diciembre de 2014	Presupuest o aprobado Ene-dic 2015	Presupuesto acumulativo aprobado 1 nov 2011 – 31 dic 2015	Gastos de años anteriores			Gastos ene - jun 2015 y compromisos <sup>7</sup>			Acumulativo: Gastos + compromisos (1 nov. 2011 - 30 jun 2015) (B+C+D+G)	Gastos + comp. / Presupue sto aprobado (%) (H/A)
					Noviembre 2011-2012 Gastos	2013 Gastos	2014 Gastos	Enero - junio Gastos 2015	Compromisos programáticos y financieros al 30 de junio	Gastos totales + comp. (E+F)		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>4.5:</b>												
<b>Producto 4.6:</b>	PNUD	3.738.318		3.738.318			140.045	103.264	3.495.008	3.598.272	3.738.317	
<b>Subtotal de Resultado 4</b>		<b>12.206.957</b>	<b>3.240.383</b>	<b>15.447.340</b>	<b>1.077.882</b>	<b>1.629.769</b>	<b>2.717.219</b>	<b>1.925.248</b>	<b>5.685.639</b>	<b>7.610.887</b>	<b>13.035.757</b>	<b>84%</b>
<b>Resultado 5: Se abordan y respetan las salvaguardas y se llevan a efecto los beneficios múltiples de REDD+.</b>												
<b>Producto 5.1:</b>	PNUD	753.390		753.390	279.763	-27.449	64.345	34.624	40.000	74.624	391.283	
	PNUMA	2.380.575	1.389.637	3.770.212	157.152	703.707	1.095.271	424.445	1.104.697	1.529.142	3.485.272	
<b>Producto 5.2:</b>	FAO	1.704.765		1.704.765	337.287	359.689	363.259		415.111	415.111	1.475.346	
	PNUD	1.620.365	533.235	2.153.600	445.308	187.501	197.774	106.660	280.208	386.868	1.217.451	
	PNUMA	2.637.801	1.011.156	3.648.957	281.783	569.572	829.777	956.669	745.895	1.702.564	3.383.696	
<b>Producto 5.3:</b>	FAO		326.706	326.706				184.534	58.652	243.186	243.186	
	PNUD	1.197.063	471.760	1.668.823	604.335	249.326	292.214	97.514	535.730	633.244	1.779.119	
	PNUMA	3.472.017	785.104	4.257.121	1.344.422	527.213	959.529	640.853	785.104	1.425.957	4.257.121	
<b>Subtotal de Resultado 5</b>		<b>13.765.976</b>	<b>4.517.598</b>	<b>18.283.574</b>	<b>3.450.050</b>	<b>2.569.559</b>	<b>3.802.170</b>	<b>2.445.299</b>	<b>3.965.397</b>	<b>6.410.696</b>	<b>16.232.475</b>	<b>89%</b>
<b>Resultado 6: Transformación hacia una economía verde y fortalecimiento mutuo entre las estrategias y las inversiones de REDD+.</b>												
<b>Producto 6.1:</b>	PNUMA	2.208.991	443.924	2.652.915	296.792	605.855	709.263	597.081	443.923	1.041.004	2.652.914	
<b>Producto 6.2:</b>	PNUMA	2.590.603	591.822	3.182.425	605.415	622.219	598.134	764.835	530.538	1.295.373	3.121.141	
	PNUD	213.102		213.102	26.450	61.995	69.295	69.020	37.319	106.339	264.079	
<b>Producto 6.3:</b>	PNUD	1.675.000	377.878	2.052.878			657.457	314.779	1.080.642	1.395.421	2.052.878	
	PNUMA	2.974.906	672.576	3.647.482	812.923	617.477	372.413	1.073.226	771.444	1.844.670	3.647.483	
<b>Subtotal de Resultado 6</b>		<b>9.662.602</b>	<b>2.086.200</b>	<b>11.748.802</b>	<b>1.741.580</b>	<b>1.907.546</b>	<b>2.406.562</b>	<b>2.818.941</b>	<b>2.863.866</b>	<b>5.682.807</b>	<b>11.738.495</b>	<b>100%</b>
<b>Resultado 7: El conocimiento del Programa ONU-REDD se desarrolla, analiza y comparte para apoyar los esfuerzos de REDD+ en todos los niveles (liderados/coordinados por la secretaría).</b>												
<b>Producto 7.1:</b>	FAO y Sec	218.026		218.026	219.481	11.112					230.593	
	PNUD y Sec	620.704	185.040	805.744	9.990	33.240	66.695	74.079		74.079	184.004	

Resultado del Programa (Referencia: Documento Marco del Programa Global de AAN)	Org. ONU Part.	Presupuesto aprobado 1 nov 2011 – 31 de diciembre de 2014	Presupuest o aprobado Ene-dic 2015	Presupuesto acumulativo aprobado 1 nov 2011 – 31 dic 2015	Gastos de años anteriores			Gastos ene - jun 2015 y compromisos <sup>7</sup>			Acumulativo: Gastos + compromisos (1 nov. 2011 - 30 jun 2015) (B+C+D+G)	Gastos + comp. / Presupuesto aprobado (%) (H/A)
					Noviembre 2011-2012 Gastos	2013 Gastos	2014 Gastos	Enero - junio Gastos 2015	Compromisos programáticos y financieros al 30 de junio	Gastos totales + comp. (E+F)		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
	PNUMA y Sec	487.134	184.435	671.569	269.491	27.307	117.766	63.602	144.431	208.033	622.596	
Producto 7.2:	FAO y Sec	949.911	235.531	1.185.442	213.866	288.017	307.671	246.677	23.198	269.875	1.079.429	
	PNUD y Sec	1.799.611	78.750	1.878.361	40.416	24.653	141.120	335.375	349.523	684.898	891.087	
	PNUMA (Sec)	860.915	382.305	1.243.220	44.589	412.984	211.493	168.221		168.221	837.287	
Producto 7.3:	PNUMA	1.100.000	-	1.100.000			616.473	26.033	457.494	483.527	1.100.000	
Subtotal de Resultado 7		6.036.302	1.066.061	7.102.363	797.832	797.313	1.461.217	913.987	974.646	1.888.633	4.944.995	70%
Resultado 8: Se han proporcionado servicios del Secretariado del Programa ONU-REDD, oportunos y efectivos, a los países socios de ONU-REDD, la Junta Normativa y los organismos de la ONU.												
Producto 8.1:	Todos	2.776.018	532.517	3.308.535	564.230	557.315	1.341.454	262.613	178.718	441.332	2.904.330	
Producto 8.2:	Todos	1.295.237	571.971	1.867.208	379.629	531.982	304.876	248.024	168.790	416.814	1.633.301	
Producto 8.3:	Todos	1.079.364	574.583	1.653.947	355.638	421.351	152.438	291.793	198.576	490.369	1.419.795	
Producto 8.4:	Todos	2.048.940	875.010	2.923.950	739.160	607.980	548.777	320.972	218.433	539.405	2.435.322	
Producto 8.5:	Todos	1.560.107	320.407	1.880.514	273.425	202.660	548.777	557.529	176.602	734.131	1.758.993	
Producto 8.6:	Todos	288.834	418.858	707.692	-	126.662	152.438	189.665	129.075	318.740	597.840	
Producto 8.7:	Todos	1.200.000	-	1.200.000	-	-	2.346	267.864	932.136	1.200.000	1.202.346	
Subtotal de Resultado 8		10.248.500	3.293.346	13.541.846	2.312.082	2.447.950	3.051.104	2.138.461	2.002.330	4.140.791	11.951.927	88%

Resultado del Programa (Referencia: Documento Marco del Programa Global de AAN)	Org. ONU Part.	Presupuesto aprobado 1 nov 2011 – 31 de diciembre de 2014	Presupuest o aprobado Ene-dic 2015	Presupuesto acumulativo aprobado 1 nov 2011 – 31 dic 2015	Gastos de años anteriores			Gastos ene - jun 2015 y compromisos <sup>7</sup>			Acumulativo: Gastos + compromisos (1 nov. 2011 - 30 jun 2015) (B+C+D+G)	Gastos + comp. / Presupue sto aprobado (%) (H/A)
					Noviembre 2011-2012 Gastos	2013 Gastos	2014 Gastos	Enero - junio Gastos 2015	Compromisos programáticos y financieros al 30 de junio	Gastos totales + comp. (E+F)		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
Total por Org. ONU Part. (todos los resultados):	FAO	31.617.355	11.314.609	42.931.964	7.477.010	6.223.809	8.945.353	7.427.306	8.044.176	15.471.482	38.117.654	89%
	PNUD	34.220.102	10.050.699	44.270.801	4.817.235	6.354.018	9.408.291	4.897.069	11.918.904	16.815.973	37.395.517	84%
	PNUMA	25.864.684	7.969.219	33.833.903	5.247.966	5.364.664	8.012.893	6.436.205	6.416.281	12.852.486	31.478.009	93%
Costo de apoyo indirecto (7%)		6.419.150	2.053.417	8.472.567	1.225.955	1.255.974	1.845.658	1.074.885	1.846.555	2.921.441	7.249.027	
Total General		98.121.291	31.387.943	129.509.234	18.768.166	19.198.465	28.212.194	19.835.466	28.225.916	48.061.382	114.240.207	88%

**Notas:**

1. Se incluye en los fondos aprobados para PNUMA la suma de US\$ 613.695 depositados directamente a PNUMA por el Gobierno de España para el Programa Global de AAN. En consecuencia, el importe no está incluido en el importe aprobado comunicado por el Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (MPTF) en el informe consolidado en la Gateway. El costo del apoyo indirecto imputado por estos fondos es del 8% de conformidad con el acuerdo de contribución firmado.
2. Las organizaciones de la ONU participantes deben presentar gastos de fin de año a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Las cifras de gastos interinos se presentaron voluntariamente y, en consecuencia, las cifras actuales de 2015 no serán definitivas hasta que se presenten los gastos de fin de año. Los gastos para el período actual, enero-junio de 2015 son, en consecuencia, interinos y comprenden gastos (gastos reales) y compromisos asumidos en los sistemas de los distintos organismos por las Organizaciones de ONU participantes. Si bien los compromisos no se reflejan en la MPTF Gateway, representan obligaciones vinculantes que se desembolsarán en períodos futuros.
3. Como consecuencia de las fechas de corte del sistema para la comunicación de datos, las cifras reales de los gastos de la FAO se subestimaron en US\$ 84.380 en la Oficina de MPTF GATEWAY. También como consecuencia de la transferencia al nuevo sistema de información financiera UMOJA SAP para PNUMA, por error no se incluyó en los gastos comunicados en la MPFT Gateway el importe de US\$ 464.927; estas dos cifras alcanzan un total de US\$ 549.307, que es la cifra correspondiente a la diferencia entre las cifras de gasto actuales de MPFT Gateway y la tabla anterior. Esto se ajustará plenamente e informará en el informe de fin de año.
4. En la actualidad, los cálculos del costo de apoyo indirecto son menores del 7%. Esto se ajustará en el informe de fin de año

## Lista de abreviaturas y acrónimos

<b>AAN</b>	Apoyo a la acción nacional de REDD+ Marco del programa global 2011-2015 (AAN)
<b>CBR+</b>	REDD+ basado en la comunidad
<b>CSO</b>	Organización de la sociedad civil
<b>DRC</b>	República Democrática del Congo
<b>FAO</b>	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
<b>FCPF</b>	Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques
<b>FLEGT</b>	Plan de acción sobre Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales
<b>FREL</b>	Nivel de referencia de emisiones para el sector forestal
<b>FRL</b>	Nivel de referencia para el sector forestal
<b>GE&amp;SP</b>	Economía verde y el sector privado
<b>GHG</b>	Gas de efecto invernadero
<b>SIS</b>	Sistema de información de salvaguardas
<b>GOV</b>	Gobernanza
<b>ICA</b>	Análisis institucional y contextual
<b>NFCI</b>	Inventario Forestal y de Carbono Nacional
<b>LCCS</b>	Sistemas de Clasificación de la Cobertura de la Tierra
<b>LULUCF</b>	Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS)
<b>MPTF</b>	Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples
<b>MRV&amp;M</b>	Medición, reporte y verificación y monitoreo
<b>NSC</b>	Comité Directivo Nacional
<b>NFI</b>	Inventario Nacional Forestal
<b>NFMS</b>	Sistema Nacional de Monitoreo Forestal
<b>NSS</b>	Sistema nacional de salvaguardas
<b>PAM</b>	Políticas y medidas
<b>PES</b>	Pagos de servicios de los ecosistemas
<b>PNG</b>	Papúa Nueva Guinea
<b>REDD</b>	Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques
<b>REL</b>	Nivel de referencia de emisiones
<b>R-PP</b>	Propuesta de preparación
<b>SE</b>	Participación de partes interesadas
<b>SF&amp;MB</b>	Salvaguardas y beneficios múltiples

<b>SIS</b>	Sistema de información de salvaguardas
<b>SLMS</b>	Sistema de monitoreo de la tierra por satélite
<b>AAN</b>	Apoyo a la acción de REDD+ nacional:
<b>SGP</b>	Programa de pequeñas asignaciones
<b>ToR</b>	Términos de referencia
<b>UNDP</b>	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
<b>UNEP</b>	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
<b>UNFCCC</b>	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
<b>ONU-REDD</b>	Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones debidas a la deforestación y degradación de los bosques (Programa ONU-REDD)
